Отчетная информация по комитету ЖКХ и транспорту ЛО.

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает, что на 01.01.2019 по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» выполнено:

1. Ведутся работы по демонтажу 500м3 РЧВ № 2
2. Ведутся работы по монтажу ограждения (забор) территории ВНС пос. Романовка.
3. Выполнены работы по установке узла учета ХВС на территории ВОС г. Всеволожска.
4. Ведутся работы по монтажу здания для фильтра- поглотителя №2. 5. Ведутся работы по монтажу перехода с новой ВНС в старую ВНС. 6.Выполнены работы по утеплению стен и устройство проф.листа , здания проходной.
7.Проводятся работы по строительству РЧВ №2 500м3.

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
на 01января 2019 года
Наименование бюджетополучателя: «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Финансирование объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» (4,998 км)	Протяженность вновь построенных водопроводных сетей (п/м)	8606 п.м (4390 сущ.+4216 постр.)	8606 п.м (4390 сущ.+4216 постр.)	1.Ведутся работы по демонтажу 500м3 РЧВ № 2. 2. Ведутся работы по монтажу ограждения (забор) территории ВНС пос. Романовка. 3. Выполнены работы по установке узла учета ХВС на территории ВОС г. Всеволожска. 4. Ведутся работы по монтажу здания для фильтра - поглотителя №2. 5. Ведутся работы по монтажу перехода с новой ВНС в старую ВНС. 6. Выполнены работы по утеплению стен и устройство проф.листа , здания проходной. 7.Проводятся работы по строительству РЧВ №2 500м3. В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 обл-го з-на от 18.05.2012 №38-оз «Об установлении случаев, при которых не требуется пол-е разреш-я на строит-во на террит-и Лен. области» не требуется пол-ие разрешения на строит-во при наличии полож-ного заключения госуд-ой экспертизы проектной док-ции и результатов инж-х изысканий. Письмо №04-5011/15-0-1 от 15.12.2015г. комитета госуд-ного строит-ного надзора и госуд-ной экспертизы Лен-ой области.
		Уровень строительной готовности (%)	40%	67%	

Отчет об освоении муниципальным образованием субсидии из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2018 год (нарастающим итогом) Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение»

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2018 году				Получено субсидий в 2018 году		Принятые в 2018 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2018 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			федеральный бюджет	областн-ой бюджет	контр-агент	номер и дата договора	сумма договора на 2018 год		Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет	област-ной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															-	
Финансирование объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» (4,998 км)	26 480,35000	0,00000	22 489,76000	3 990,59000	-	22 489,76000	ООО «Ковер»	МК№1007801 от 23.07.2018г.	30 091,30985	5 730,26858	5 730,26858	-	4870,72829	859,54029	17 619,03171	1. Ведутся работы по демонтажу 500м3 РЧВ № 2 2 Ведутся работы по монтажу ограждения (забор) территории ВНС пос. Романовка. 3. Выполнены работы по установке узла учета ХВС на территории ВОС г. Всеволожска. 4. Ведутся работы по монтажу здания для фильтра- поглотителя №2. 5. Ведутся работы по монтажу перехода с новой ВНС в старую ВНС. 6.Выполнены работы по утеплению стен и устройство проф.листа , здания проходной. 7.Проводятся работы по строительству РЧВ №2 500м^3. В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 обл-го з-на от 18.05.2012 №38-оз «Об установлении случаев, при которых не требуется пол-е разреш-я на строит-во на террит-и Лен. области» не требуется пол-ие разрешения на строит-во при наличии полож-ного заключения госуд-ой экспертизы проектной док-ции и результатов инж-х изысканий. Письмо №04-5011/15-0-1 от 15.12.2015г. комитета госуд-ного строит-ного надзора и госуд-ной экспертизы Лен-ой области.
	26 480,35000	0,00000	22 489,76000	3 990,59000	-	4 870,72829	-	-	30 091,30985	5 730,26858	5 730,26858	-	4870,72829	859,54029	-	

1. **Резервуар чистой воды 500 м^3 (РЧВ №1). Готовность – 100%.**

18/12/2018

2. **Резервуар чистой воды 500 м^3 (РЧВ №2). Готовность – 5%.**

3. **Водопроводная насосная станция (ВНС). Готовность – 65%.**

3.Фильтры поглотители №1. Готовность – 100%.

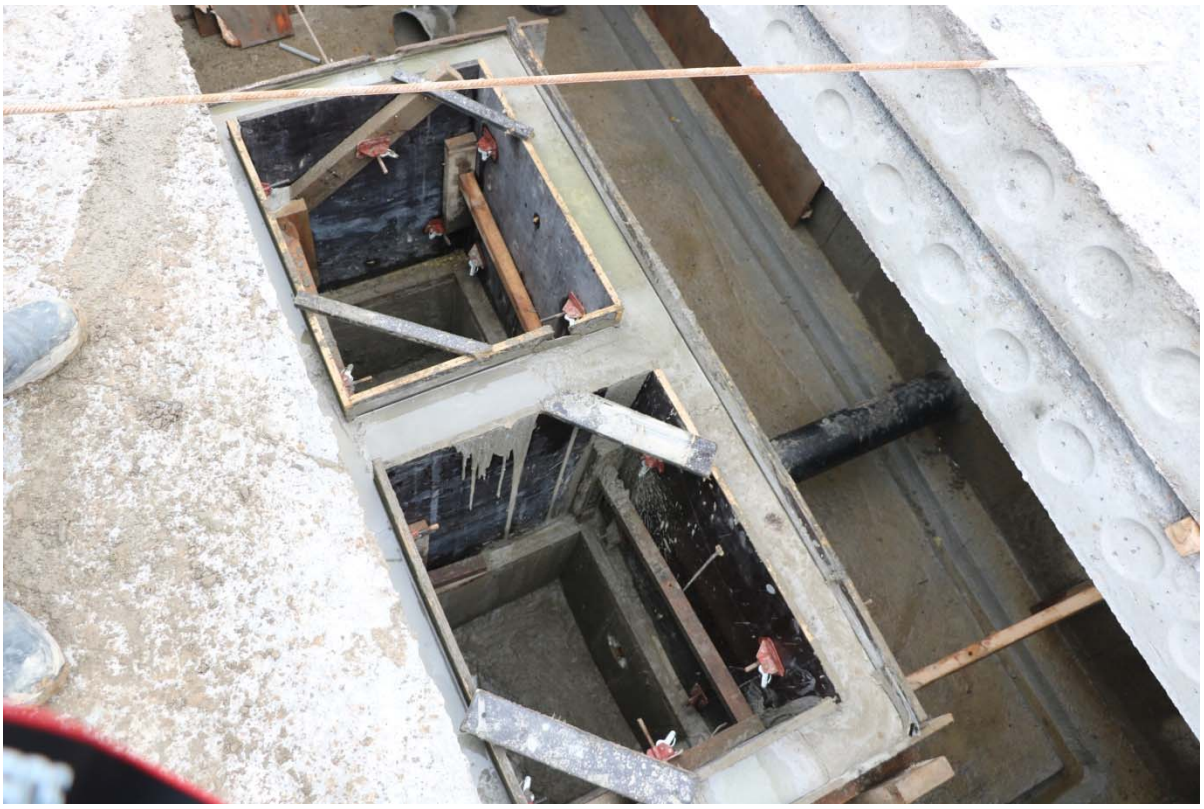

VOLVO

18/12/2018

4. **Фильтр поглотитель №2. Готовность – 10%.**

12/12/2018

18/12/2018

5. Проходная (здание). Готовность – 90%.

6.Внутриплощадочные сети. Готовность – 100%.

7.Водовод (врезка построенного водовода в существующую сеть). Готовность – 100%.

8.Благоустройство (ограждения - забор). Готовность – 90%.
